

# REPORTOVÁNÍ PROJEKTŮ v programu KANBOARD

## leden 2022

[odkaz na projekt REPORTOVÁNÍ](#)

**Stav ke dni:** 31. 12. 2021

**Zpracovalo:** oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10, Kancelář starostky

**Plnění:** Metodický postup pro zavádění strategického a projektového řízení ÚMČ Praha 10 (schválen RMČ Praha 10 dne 23. 6. 2020 usnesením č. 530)

**Zadání:** Usnesení RMČ Praha 10 č. 734 ze dne 21. 9. 2021, kterým RMČ Praha 10 vzala na vědomí informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2021 v programu Kanboard k srpnu 2021 a uložila předložit stav k prosinci 2021.


## VÝVOJ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

(21.11.2020 – 31.12.2021)

Graf znázorňuje vývoj stavu řízení projektů od zahájení projektového řízení, tj. listopad 2020 do konce prosince 2021.

- 24. 11. 2020 – zahájení projektového řízení pomocí 29 pilotních projektů.
- 21. 1. 2021 – zahájení řízení 161 projektů = pilotní projekty, projekty Akčního plánu 2021 a vybrané projekty, které jsou součástí projektových karet pro Strategii tour. Veřejný seznam vybraných projektů je uveřejněn na webu <https://strategieprodesitku.cz/projekty> (poslední aktualizace v září 2021).
- 31. 8. 2021 – řízení 184 projektů.
- 31. 12. 2021 – řízení 183 projektů.

Graf č. 1

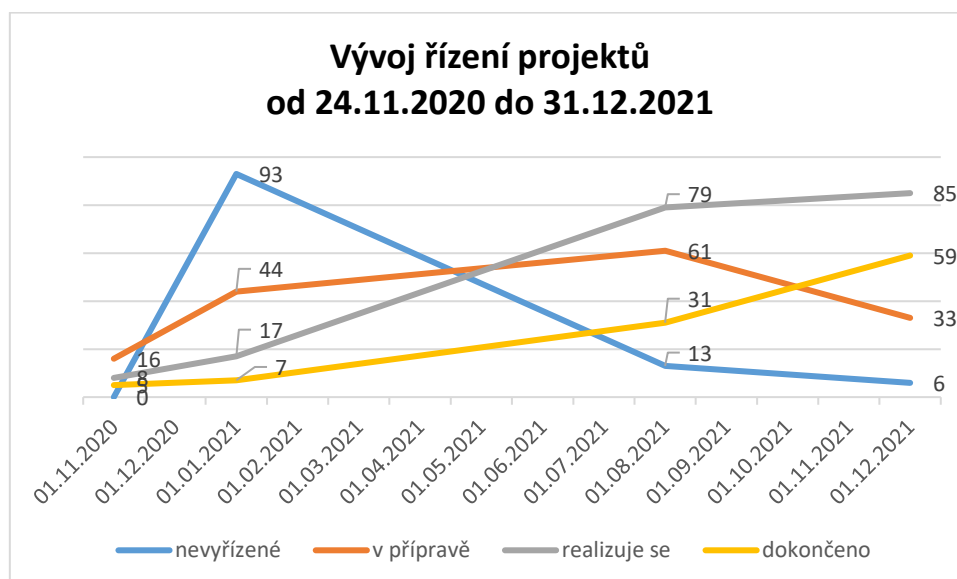

**Nevyřízené projekty** (modrá barva) = projekty, které nebyly zahájeny.

**Projekty v přípravě** (oranžová barva) = projekty, jejichž realizace je zahájena.

**Projekty realizované** (šedivá barva) = projekty, které jsou realizovány.

**Projekty dokončené** (žlutá barva) = projekty, které jsou dokončeny.


## AKTUÁLNÍ VÝVOJ

(1. 9. 2021 – 13. 12. 2021)


V roce 2020 byly v programu Kanboard vedeny pilotní projekty. V lednu 2021 byly do systému importovány projekty Akčního plánu 2021. Postupně docházelo k proškolení zaměstnanců, kteří od 1. 4. 2021 měli za úkol pravidelně (1x měsíčně) projekty reportovat, tzn. stav projektu aktualizovat.

Graf č. 2

Počet projektů k 1. 9. 2021

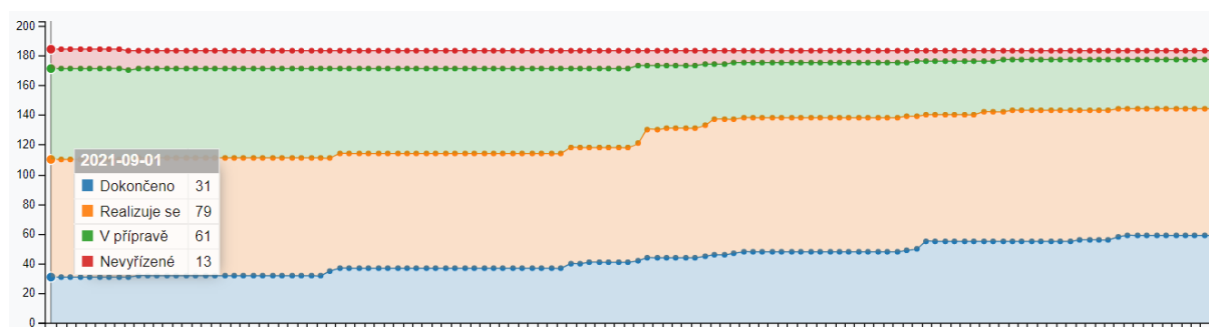


Počet projektů k 31. 12. 2021

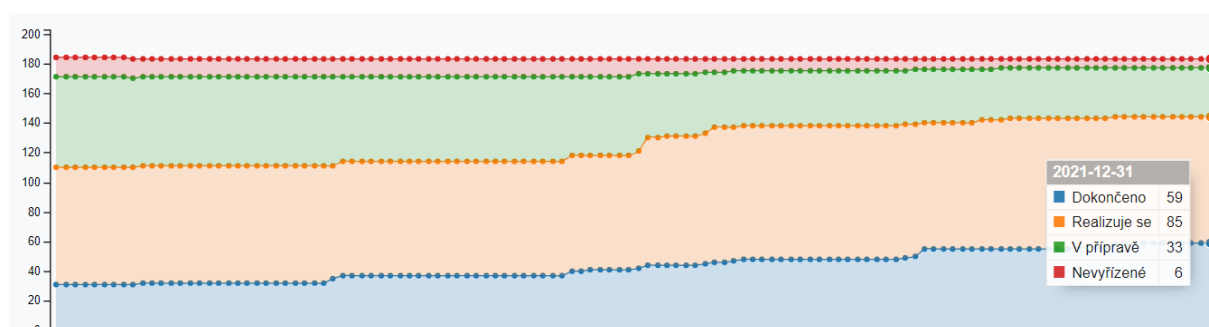

## STAV PROJEKTŮ

Graf č. 3 znázorňuje konkrétní stav projektů k 31.12.2021. Celkem **150 projektů je řízeno bez problémů**, **21 projektů čelí menším problémům**, které neohroží dokončení projektu, **9 projektů čelí vážným problémům** a pravděpodobně nebudou dokončeny. Žluté projekty nejsou dosud zahájeny.


Graf č. 3

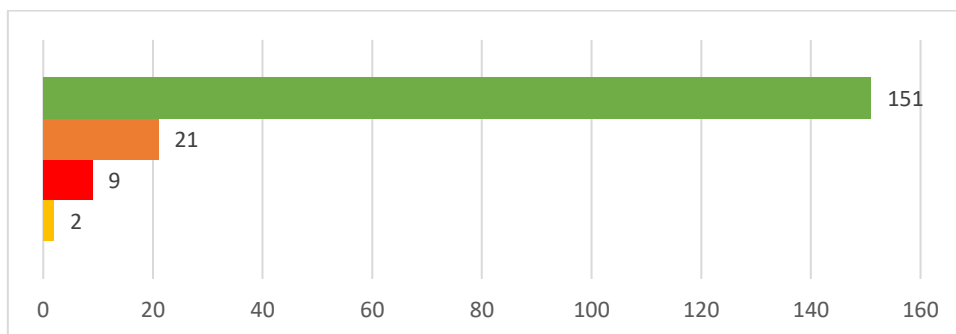

## ŘÍZENÍ PROJEKTŮ ODBORY ÚMČ PRAHA 10

V grafu č. 4 je u každého odboru ÚMČ Praha 10 (1 projekt řídí příspěvková organizace Školní jídelna Praha 10 a 2 projekty akciová společnost Praha 10 – Majetková) označen modrou barvou celkový počet projektů (spodní číslo) a červenou barvou počet dokončených projektů z celkové hodnoty (spodní číslo). Většina projektů je dlouhodobých, proto nejsou během jednoho roku dokončeny a jejich realizace může trvat delší období nebo jsou to každoročně opakující projekty/akce, viz Odbor sociální - v jednom roce jsou všechny zrealizovány a v dalším roce jsou opět zahájeny.

Graf č. 4

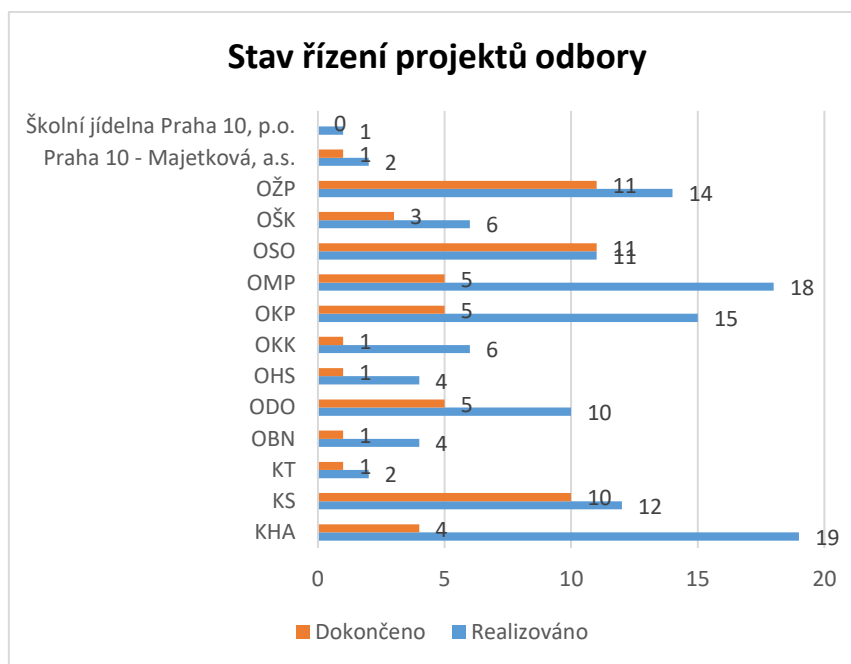

Projekty řídí celkem 48 zaměstnanců, kteří jsou jednou ročně proškoleni pro práci v programu Kanboard. Na podzim 2021 bylo tak proškoleno 45 zaměstnanců. V průběhu roku se mohou kdykoliv obrátit na oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář starostky, které má projektové řízení na starosti.

V tabulce jsou uvedeni zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří řídili do 31. 12. 2021 nejvíce projektů. Zároveň 18 zaměstnanců řídí 1 projekt, 13 zaměstnanců řídí 2 projekty, zbývající zaměstnanci řídí buď 3, nebo 4 projekty.

Daníček František ODO	14
Tláškalová Zamillová Ivana KHA	12
Zákorová Linda OSO	10
Procházka Jiří OŽP	9
Hájková Iva KS	6
Jonášová Petra OSO	6
Kučerová Lucie KHA	6
Urbánek Tomáš OMP	6
Řurica Jakub OBN	5
Hradecký Michal OŽP	5

## SHRNUTÍ

Během jednoho roku při zavádění projektového řízení bylo nutno nastavit systém pro řízení projektů v programu Kanboard a vyškolit okolo 50 pracovníků, kteří řídí projekty převážně Akčního plánu. Na podzim minulého roku došlo ke sjednocení způsobu vedení projektů mezi všemi uživateli. Výhodou projektového řízení v programu Kanboard je jeho přehlednost, jednoduchost, soustředění projektů Akčního plánu na jedno místo a sledování jejich realizace.

V programu Kanboard vedeme i audity udržitelného rozvoje pro kategorii B místní Agendy 21, indikátory jak strategického plánu, tak auditů udržitelného rozvoje, Programové prohlášení RMČ Praha 10, návody pro práci v Kanboardu, které přizpůsobujeme aktuálním potřebám. Dle potřeby je možno Kanboard využívat i pro řízení úkolů odborů nebo oddělení a sledování jejich plnění.

**Všechny projekty jsou uvedeny na odkazu [ZDE](#).**

## ROZDĚLENÍ PROJEKTŮ DLE OPATŘENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU (SPUR)

